

Project ViA15

Bijeenkomst Logistics Valley Liemers-Achterhoek

11 september
2026



Welkom Rijkswaterstaat & Gelre Groen

Edmar Steneker – omgevingsmanager Rijkswaterstaat

Wilco Zeilmaker – omgevingsmanager Gelre Groen

“inzicht in de aanpak, bereikbaarheid en planning”

Inhoudsopgave

- Doel van deze bijeenkomst
- Wie Gelre Groen?
- Het project ViA15
- Verkeersfasering A12
- Werkzaamheden A12 en A15
- Communicatie
- Samen kort in gesprek
- Vragen

Doel van deze bijeenkomst

- Informeren:
 - Het project ViA15
 - Uitvoeringswijze & hinder
 - De uitvoeringsplanning in hoofdlijnen
- Reageren:
 - interactie en daarmee ophalen reacties/aandachtspunten/vragen stakeholders

Waar bestaat GelreGroen uit?



Projectopgave ViA15



- 12 km nieuwe snelweg (A15)
- 21 kilometer verbreding (A12 & A15)
- Brug over Pannerdensch Kanaal incl. fietsbrug (ca. 2,5km)
- 15 bestaande en 45 nieuwe kunstwerken
- Ca 1,2 miljoen m3 zand ontgraven
- Ca. 5000 m3 klei ontgraven
- 4,5 km geluidscherm
- Aanleg Snel fietsroute SFR15

4 Deelgebieden - elk met een eigen identiteit en karakter

Deelgebied 1 - A15 West

- Verbreding A15, geen files, ruimte

Deelgebied 2 - Pergola & Brug


- Brugsysteem, raakvlak met Betuweroute, Natura-2000, Pannerdensch Kanaal

Deelgebied 3 - A15 Oost – Verdiepte ligging

- (Half) verdiepte ligging; stakeholder impact

Deelgebied 4 - A15 Oost en A12

- Verbreding A12, file gevoelig,

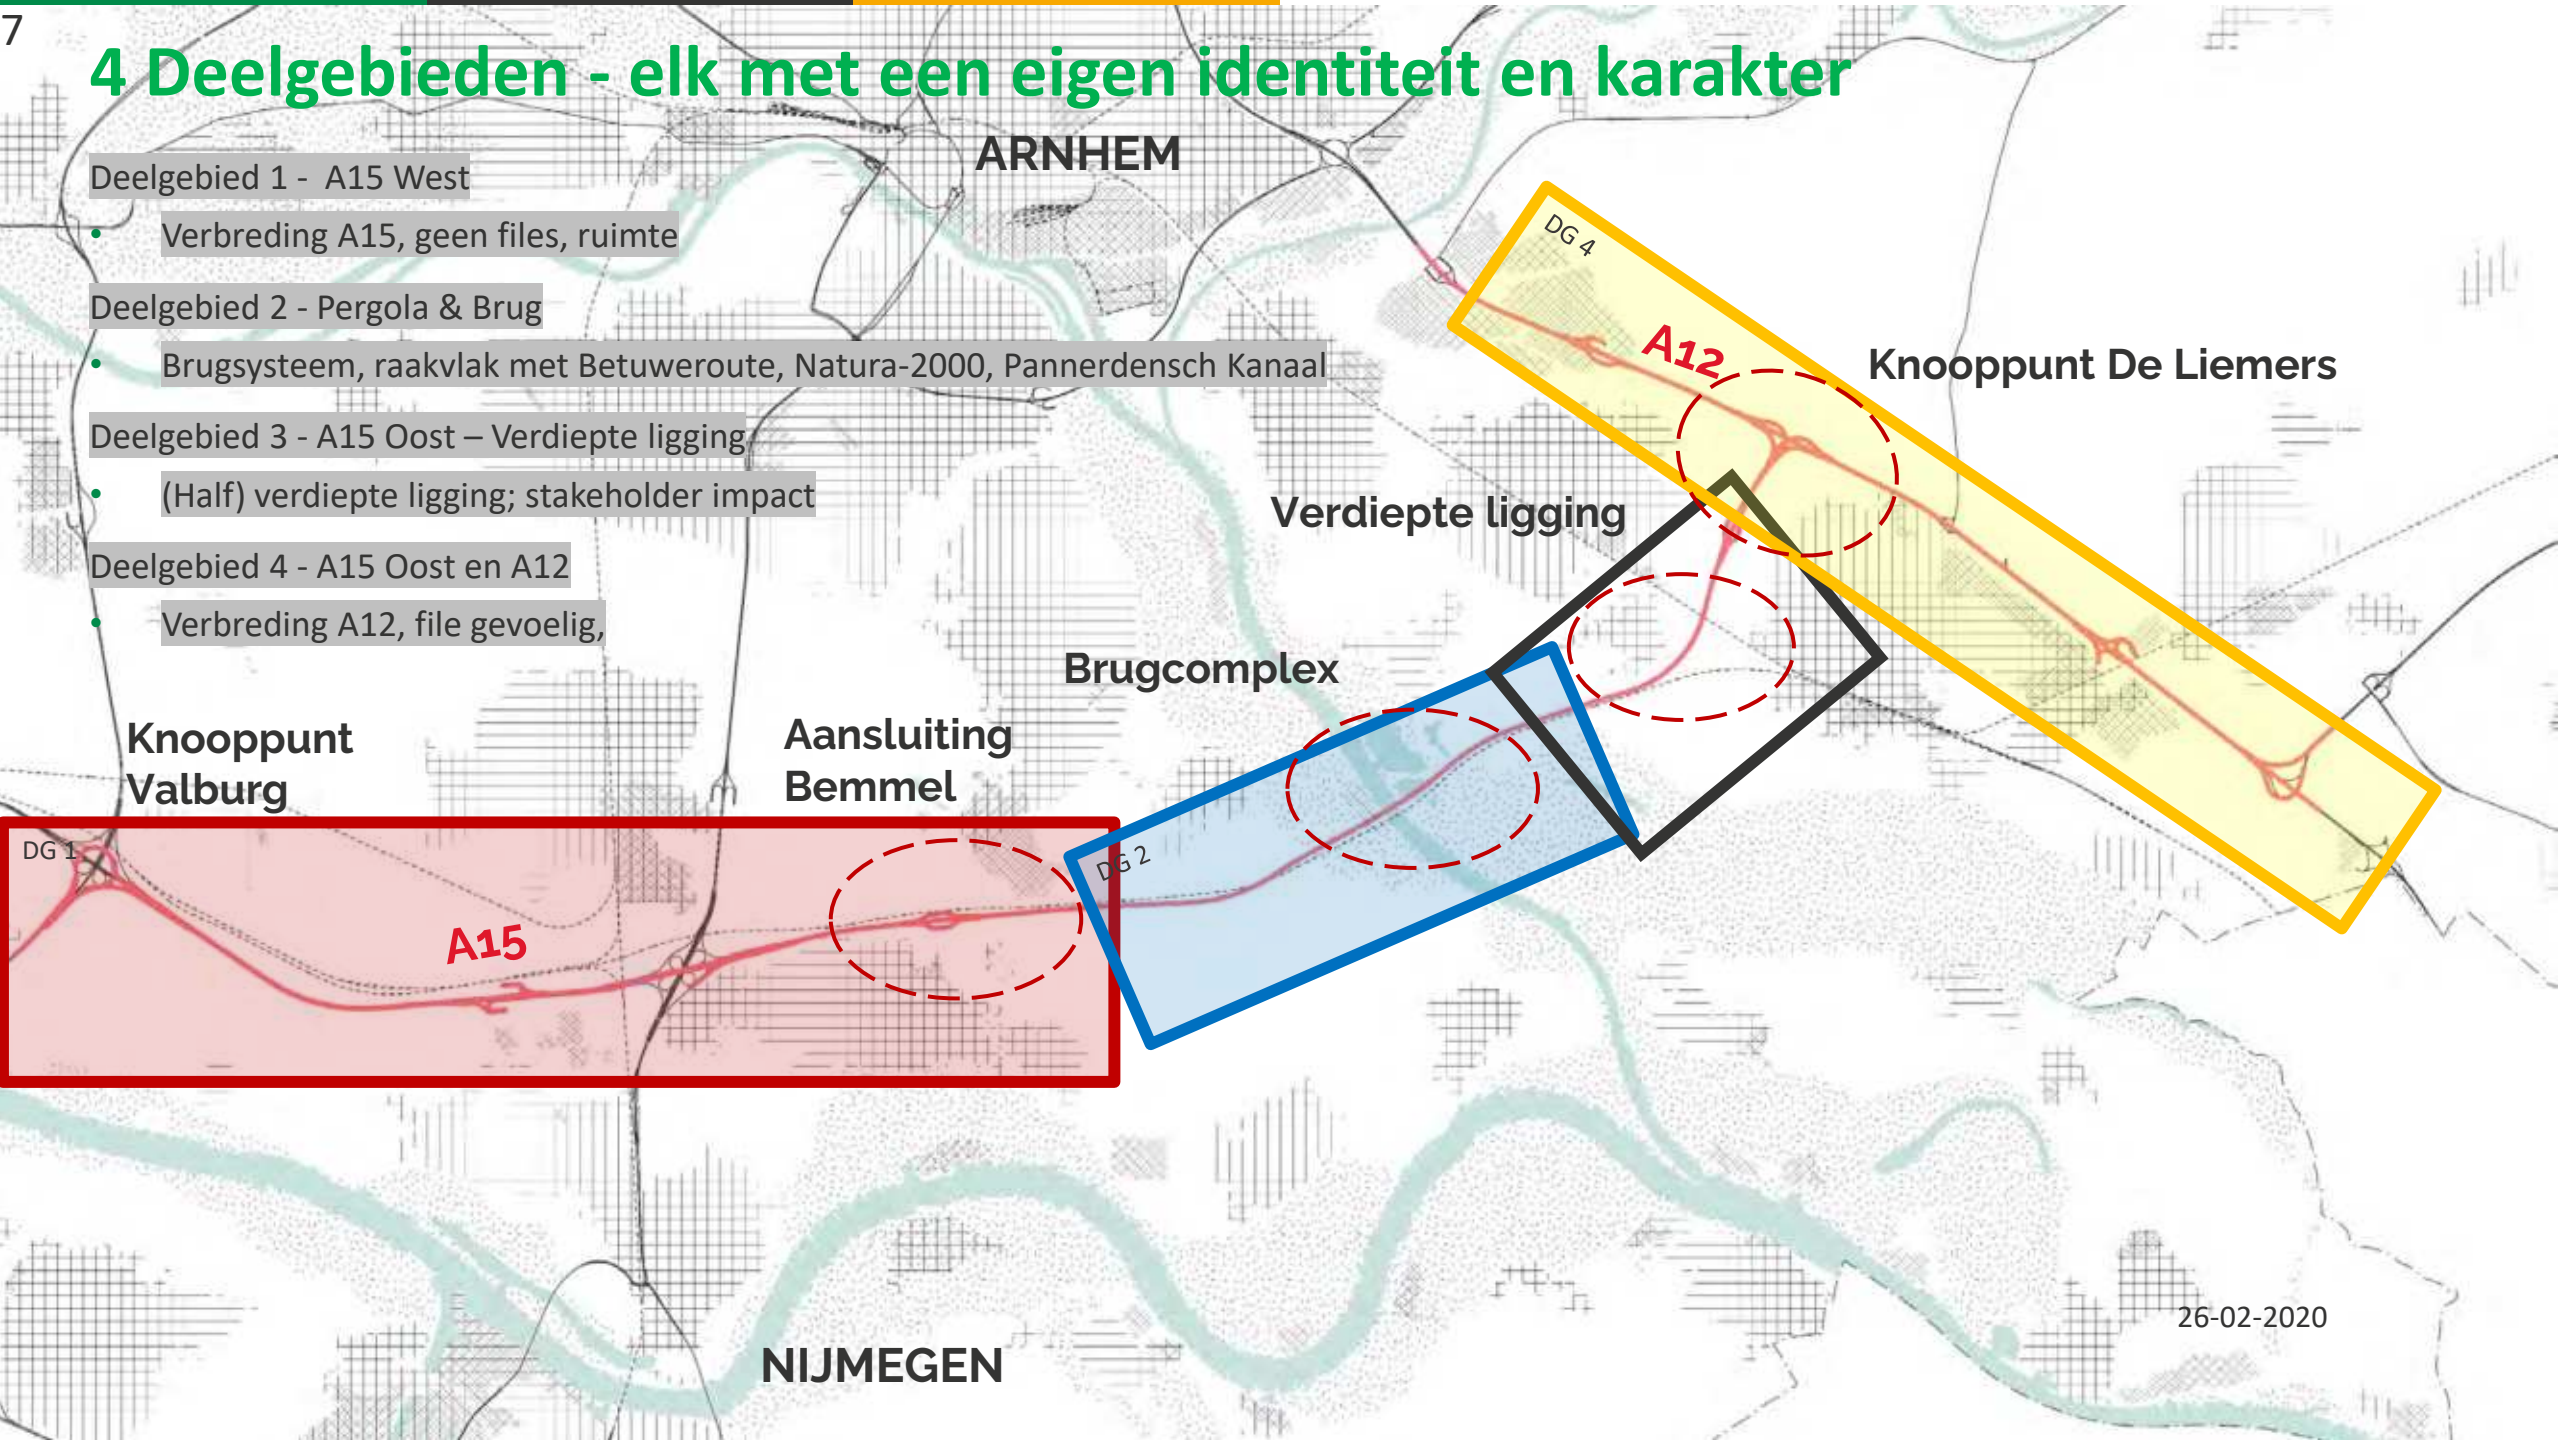

Brug Pannerdensch Kanaal

- Lengte: ca. 2,5 km met vrije overspanning van ca. 160 m



Verdiepte ligging

- (Half) verdiept om Groessen: Verdiepte bak over een lengte van ca. 1,23 km.
- Ter hoogte van buurtschap Helhoek overdekt 'deksel van Helhoek'




GelreGroen



Bouwmethode: verdiepte ligging

Bouwen “in den natte”

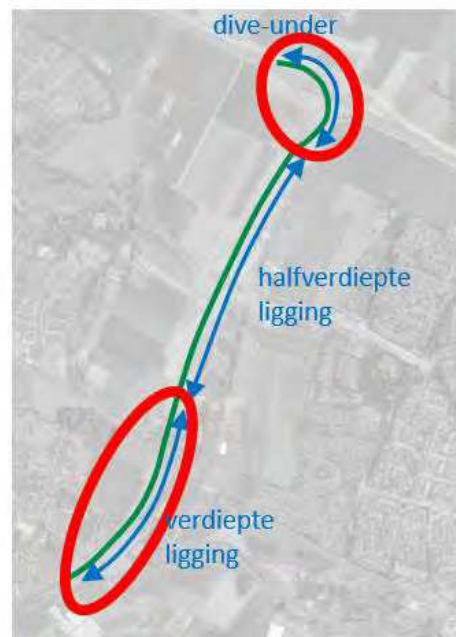

Aanbrengen damwanden
& nat ontgraven



Aanbrengen betonvloer




leegpompen bouwkuip



Bouwmethode: half verdiepte ligging

Bouwen “in den natte”

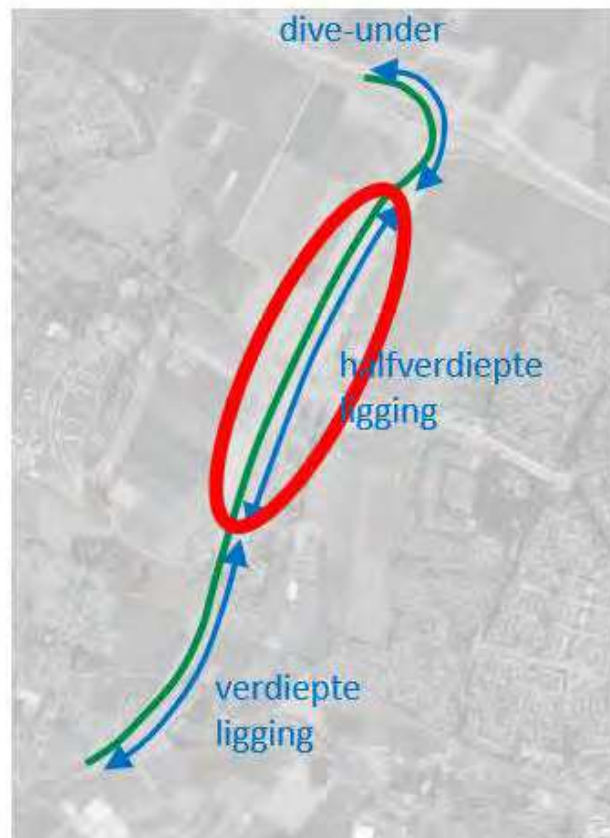

Knooppunt de Liemers

- Nieuw knooppunt: De Liemers
Aansluiting nieuwe deel A15 met
bestaande A12



Voortgang werkzaamheden – Betuwe & De Liemers

De Pergula



Verdiepte ligging



Voortgang werkzaamheden – De Liemers

Half verdiepte ligging



Voortgang werkzaamheden – verbreden A12

Knooppunt de Liemers




Nieuwe aansluiting Zevenaar-oost



Verkeersfasering A12

Uitgangspunt: 2 aansluitingen Zevenaar – A12


Afweging tussen 4-0 verkeerssysteem en
2 rijstroken x 90 km/u bestaande indeling

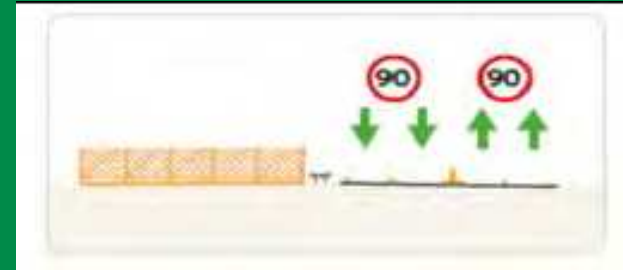

Voorkeur voor 2 rijstroken x 90 km/u bestaand profiel met reguliere rijstroken:

- D.m.v. betonnen barrier op vluchtstrook, inclusief vluchthavens
- Meer capaciteit HWN door huidige rijstrookindeling en daarmee een mindere verdrijving naar OWN
- Minder en minderlange afsluitingen van toe- en/of afritten
- Borging verkeersveiligheid HWN en OWN
- Afstemming doorgang nood- en hulpdiensten, en acute zorg op HWN en OWN

Verkeersfasering A12

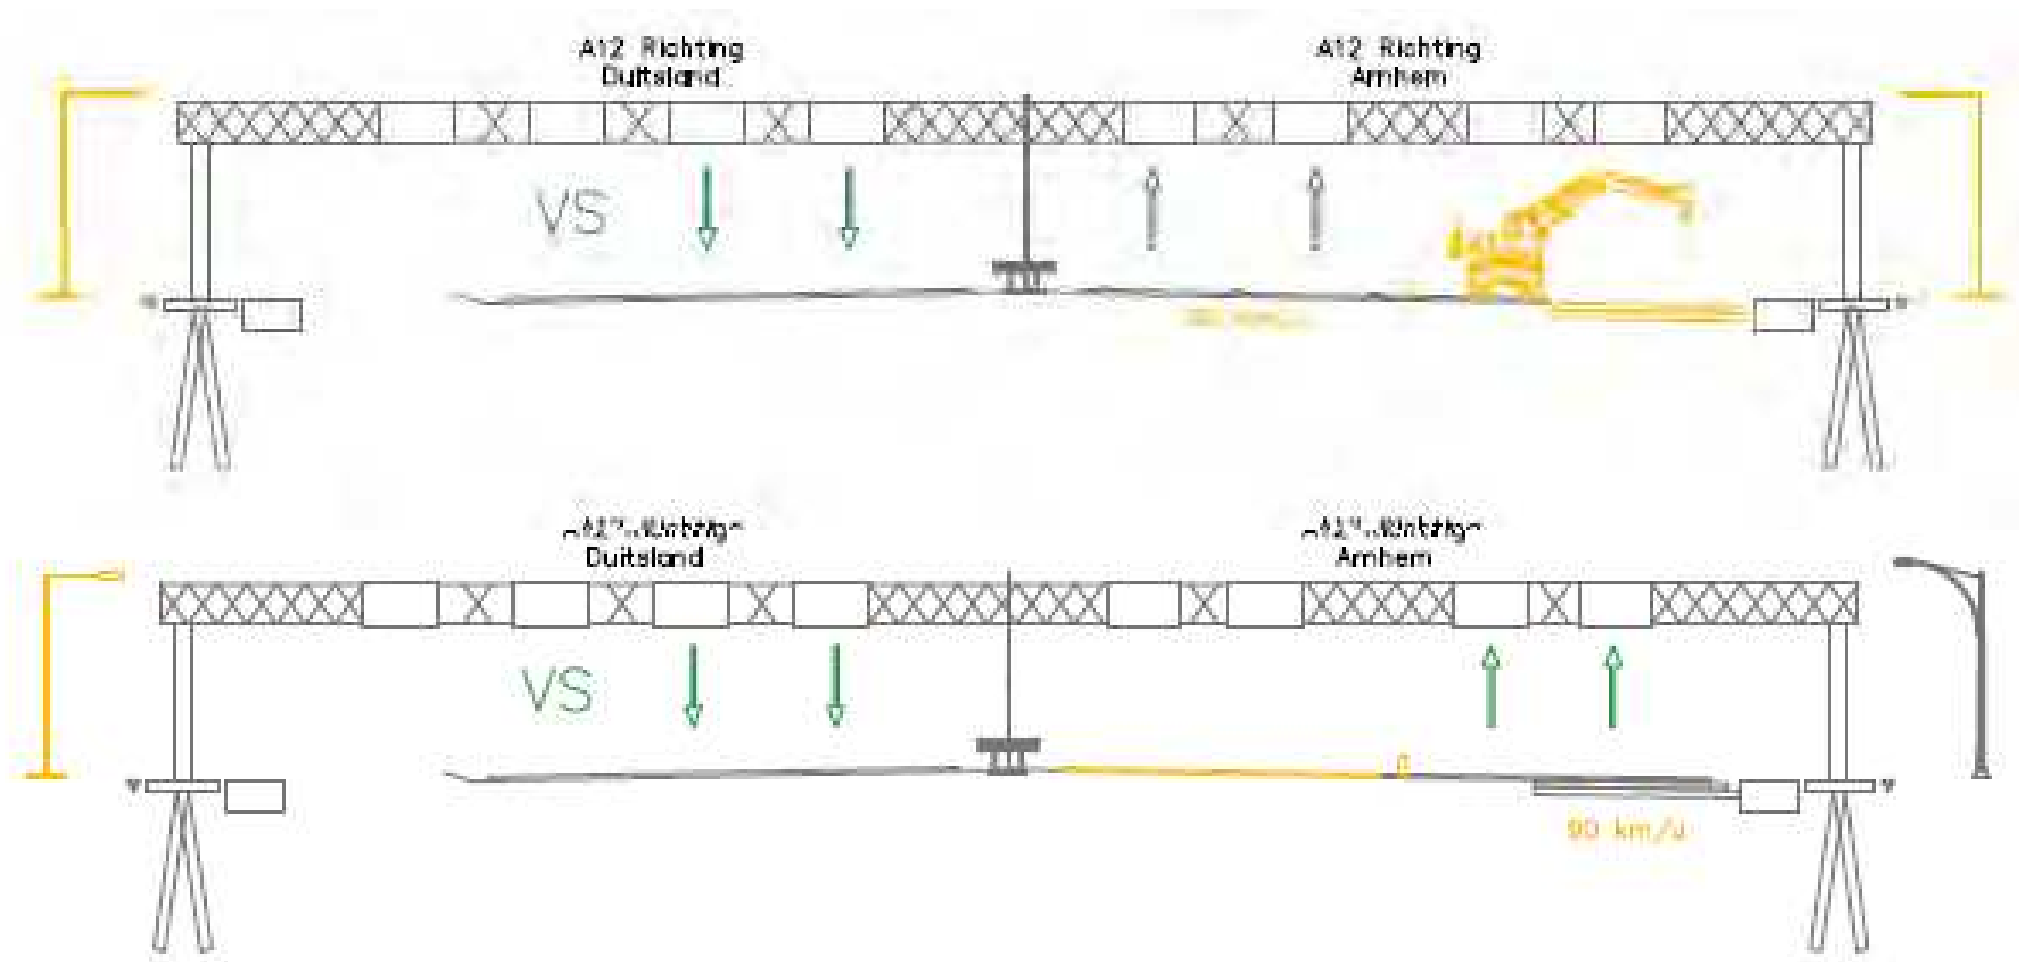

Verkeersfasering A12

Verkeerskundige analyse 2x90 HRL

- Verkeerskundige analyse 2x90 HRL door Goudappel Coffeng hinder op de A12 en OWN.


Resultaten:

- Huidige situatie tussen Oud-Dijk en Westervoort in de ochtend- en avondspits al 5 minuten extra reistijd;
- 2x90 HRL tussen Oud-Dijk en Westervoort in de ochtend- en avondspits 5 minuten extra reistijd (dit komt er bovenop).

Monitoring van het verkeersbeeld:

- *Samen met de regionale stakeholders in het operationeel team.*

2026 - Doorkijk werkzaamheden op korte termijn A12

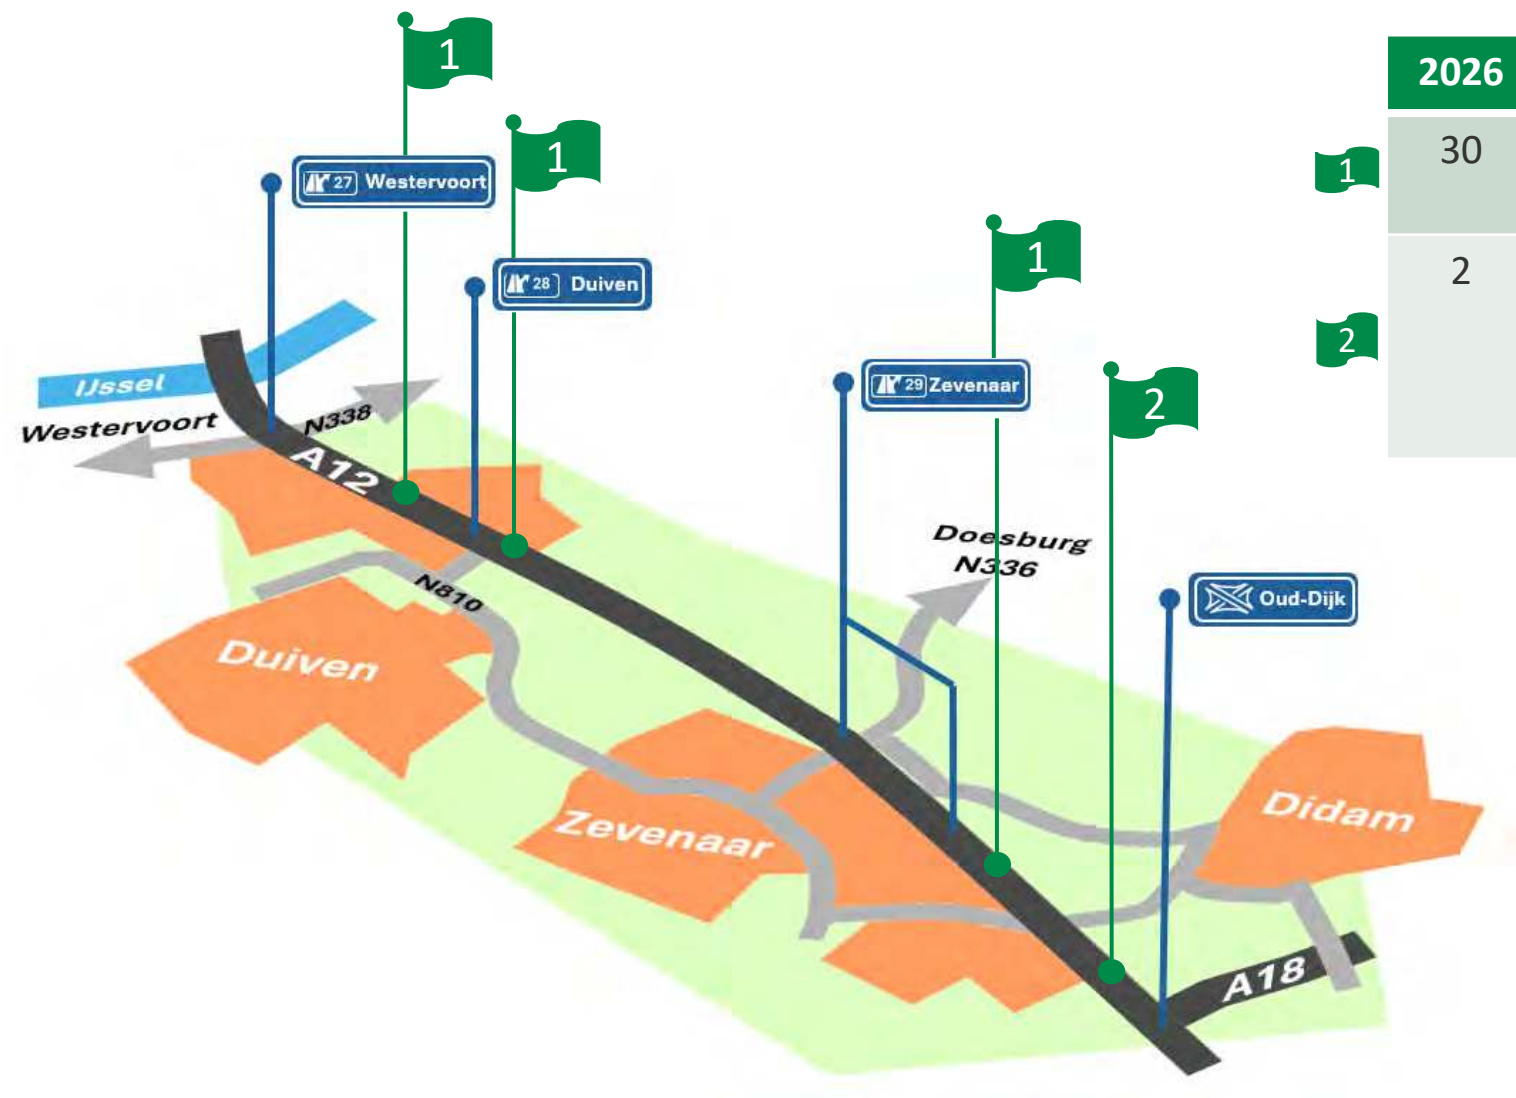

2026	Werkzaamheden	Wanneer
30	nachtafzettingen HRL (1 rijstrook open) tbv plaatsen barrier	(aug – sep)
2	Nachtafzettingen HRL en HRR (om en om) tbv Slinger op de A12 op HRL en HRR voor bouw nieuw kunstwerk Ravenstraat.	In voorbereiding (nov, slinger 6 mnd)



Blijf op de hoogte en
meer informatie via
www.via15.nl

Scan de QR-code
van de nieuwsbrief
van Rijkswaterstaat
over de
werkzaamheden



de Nieuwsbrief



Scan de QR-
code van de
bouwApp voor
updates over de
werkzaamheden



de Bouwapp

Plaatsen barriers op vluchtstrook:

Werkzaamheden in de avond en
nacht tussen 20:30u – 5:00u.

1 rijbaan richting Arnhem
beschikbaar.

In de avond en nacht van 3 op 4
augustus toert Zevenaar met
N336 gestremd tussen 22:00u
en 5:00u. Het verkeer wordt
vanaf hier omgeleid naar de
aansluiting met de A12
Tatelaarweg richting Arnhem.


GelreGroen

17-9-2026




Rijkswaterstaat

2027 - Realisatie 2 duikers door de A12

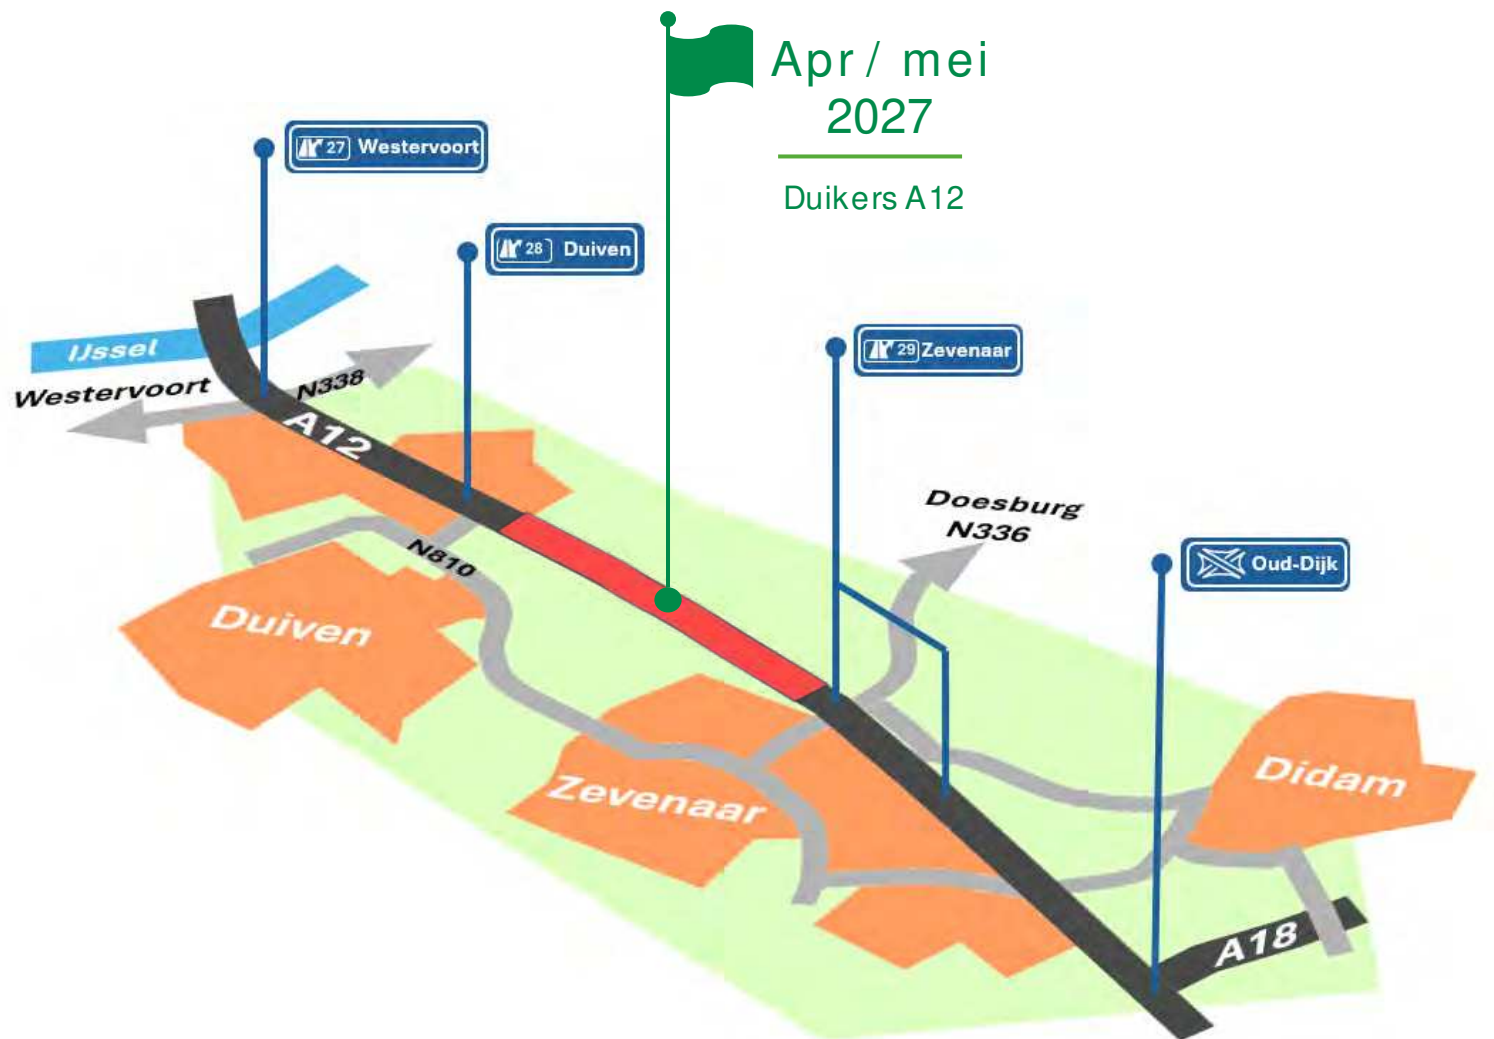


2 Weekenden en 2 reserve weekenden
Tijdelijke bypass knp de Liemers tot eind 2028


Weekend 1
HRL dicht

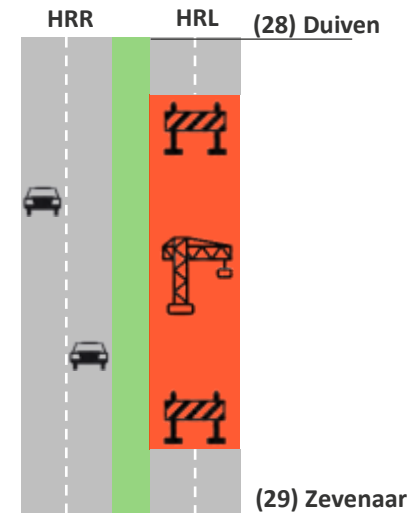


Na weekend 1

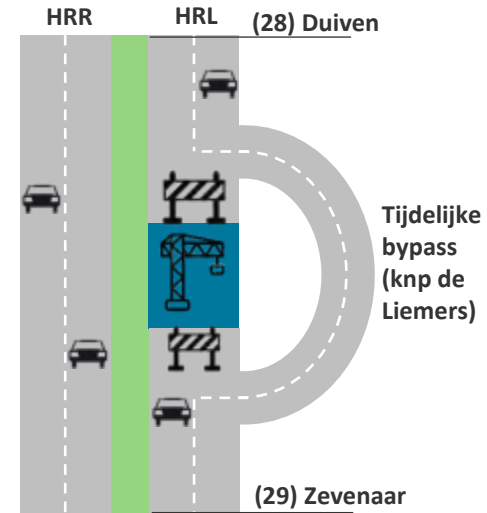


Weekend 2
HRR dicht

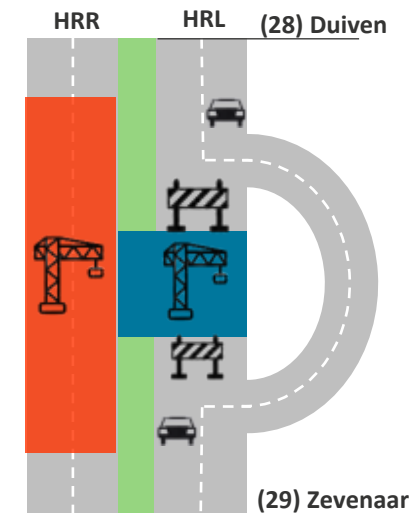

Na weekend 2

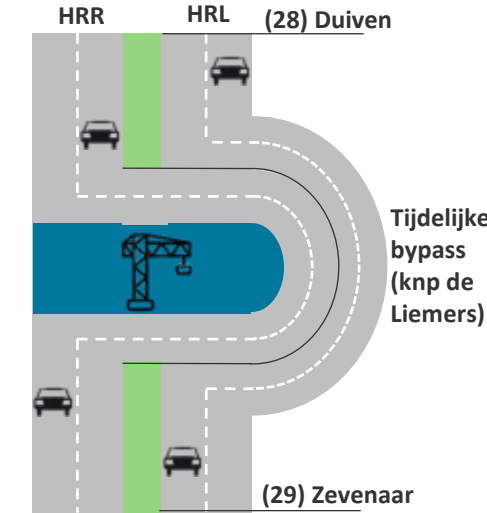

2027 – Verkeer door bypass KW59 A12

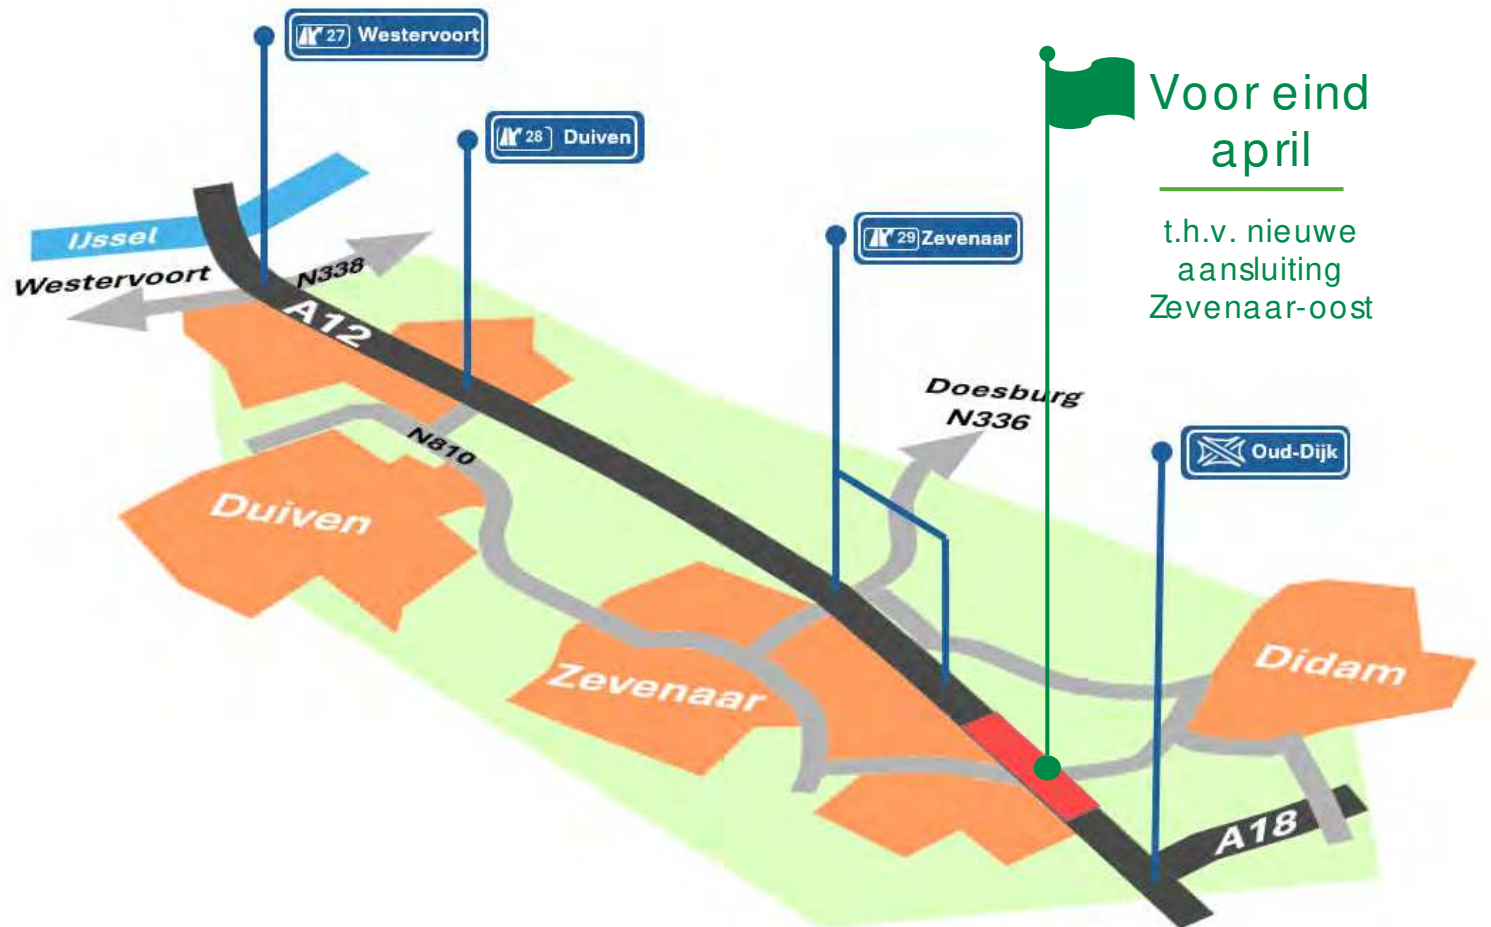


Voor eind april


t.h.v. nieuwe aansluiting Zevenaar-oost

*TVP staat voor *Trein vrije Periode*


Voor start TVP* (Het verkeer zal in april gebruikmaken van de bypass. Exacte datum volgt nog.)

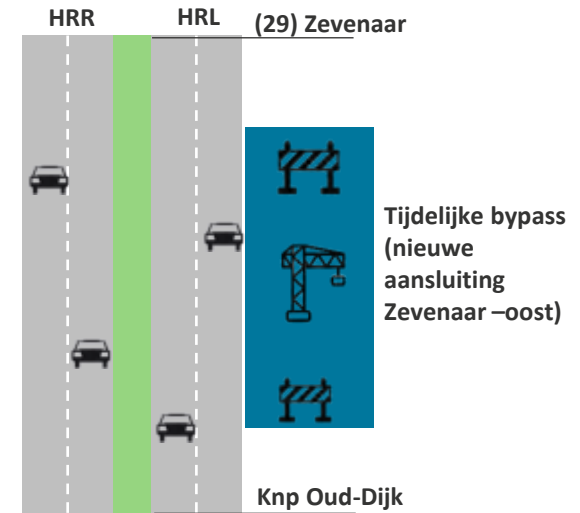


Tijdens TVP* | sloop viaduct

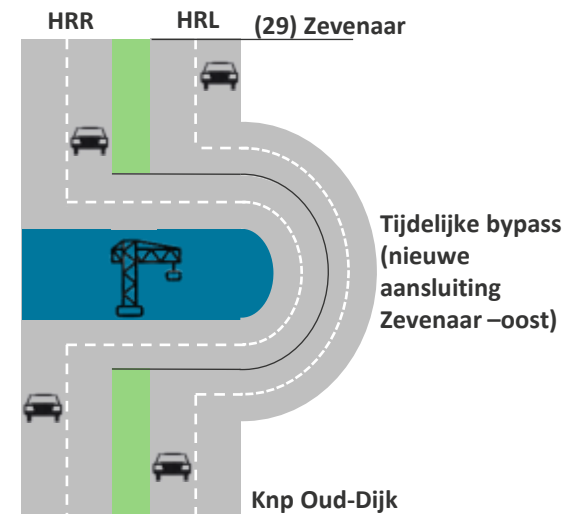

2027 - Doorkijk werkzaamheden op lange termijn

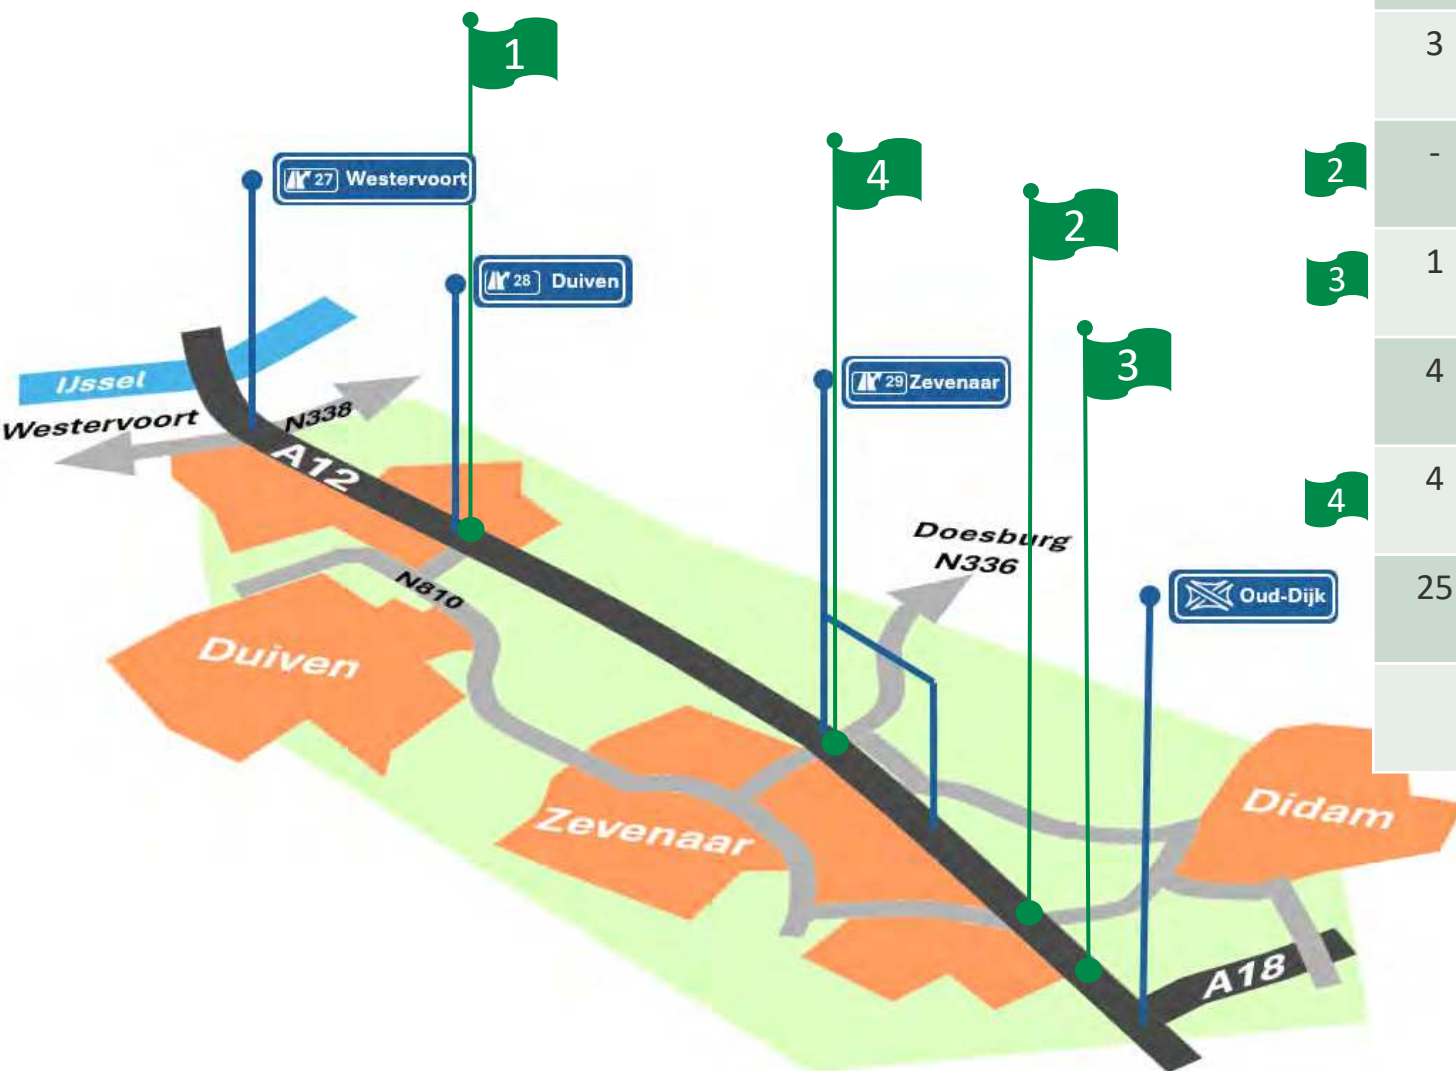

2027	Werkzaamheden	Wanneer
4	Weekendafsluitingen aansluiting Duiven (28). Toe- en afrit op afzonderlijk afsluiten.	In voorbereiding (jun – aug)
3	Weken versmald 2x90 systeem op A12 HRL	In voorbereiding (aug – sept)
-	Openstelling nieuwe aansluiting Zevenaar-oost (Hengelderweg)	Q3-2027
1	Weekendafsluiting sloop KW Ravenstraat	In voorbereiding (nov)
4	Weekenden 1 rijstrook 70 km/h op HRR.	In voorbereiding (Q4-2027)
4	Weken gefaseerde werkzaamheden aan toe- en afritten in de nacht.	In voorbereiding (Q4-2027)
25	Nachtafzettingen HRR (1 rijstrook open) t.b.v. opbouw 2 x 90..	In voorbereiding (dec – jan 2028)
	Diverse Verkeersstops t.b.v. vervangen Portalen.	In voorbereiding (Q4-2027)



Verbreden A12

Globale planning

Q4 2025	Financial Close
Q1-2026	Vorbereidende werkzaamheden (o.a. start bouwwegen)
Q3-2026	Start verbreding A12 HRL
Q3-2027	Aansl. 29 (Hengelder / 7-poort) open
Q4-2027	Start verbreding A12 HRR
Q1-2028	3 ^e rijstrook A12 HRL open
Q3-2028	3 ^e rijstrook A12 HRR open
Q3-2029	Verbreding A12 en A15 gereed
Q4-2031	Doorgetrokken A15 gereed

Doorkijk werkzaamheden A15

Korte en lange termijn

2026		
2	Nachtafsluitingen N15 tussen knp. Ressen en Bommel	21-10 op 22-10 22-10 op 23-10
1	Weekendafsluiting N15 tussen knp. Ressen en Bommel	23-10 tot en met 26-10 Reserve 20-11 tot en met 23-11
	Verlegging s-boog knp Ressen (permanente inrichting)	Na week 43
	Asfaltreparaties A15	In voorbereiding n.t.b.
	Openstelling tijdelijke rotonde Bommel	Wk 49
2027		
1	N15 weekendafsluiting t.b.v. inrichting Slinger de Plak en verlegging N15	mei
	Slinger de Plak	Na weekend in mei
1	Weekend opbouw verkeerssysteem vluchtstrookonttrekking en bouwweg op R1	Sept
	Systeem vluchtstrookonttrekking en bouwweg op R1 tussen knp Ressen en afrit Elst	Sept/okt
2	Nachtafzettingen inrichting fasering A325 fase 1	okt
	A325 fasering	okt
2028		
	2x90 versmald	2028
	Werkzaamheden knp Valburg	2028

Hengelder



Hengelder

- Fase 1 (juli 2026 – Q3-2027): Bouwen bypass naast bestaande KW en openstelling nieuwe aansluiting op Hengelderweg
- Fase 2 (medio 2027 - medio 2028): Gebruiksfase bypass, slopen bestaande KW + realiseren nieuw KW
- Fase 3 (medio 2028): inschuiven en afbouwen nieuw KW, draaien deklagen, amoveren bypass, inrichten eindsituatie OVN



Communicatie

Woningen en bedrijven dichtbij:

- Persoonlijk contact
- Brieven informeren we over werkzaamheden

Woningen en bedrijven verder weg:

- Nieuwsbrief en website: www.via15.nl
- Bouwapp:

Bereikbaar:

- Centraal telefoonnummer: 085 - 400 5500
- Centraal mailbox: contact@gelregroen.nl
- Via de Bouwapp



Meld u nu aan
voor onze
niewsbrief
ViA15




Bouwapp:



Volg het hele project ViA15

Maar ook per deelproject:

- Verlengen A15
- Verbreden A12
- Verbreden A15

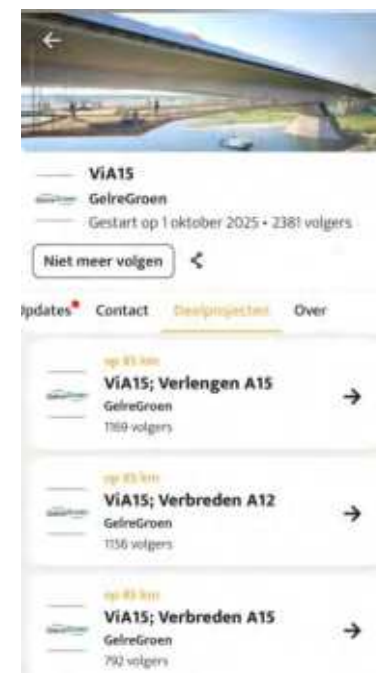

Samen kort in gesprek...


- Welke reactie hebben jullie op de planning en fasering van de werkzaamheden aan de A12?
- Wat is voor mij een '*top of mind*' ten aanzien van dit project (een zorg, een verwachting of nieuwsgierigheid)?

Stimuleer slim en schoon reizen

*Motiveer medewerkers om te fietsen, faciliteer thuiswerken, zorg voor een goede fietsenstalling, maak reizen met het OV (financieel) aantrekkelijk.
Geef mobiliteit een plek in je organisatie.*

Wij helpen met gratis advies en ondersteuning:

- Krijg **inzicht** in kansen voor jullie organisatie
- Doe mee aan onze **fietsacties en events**
- Krijg **advies op maat**

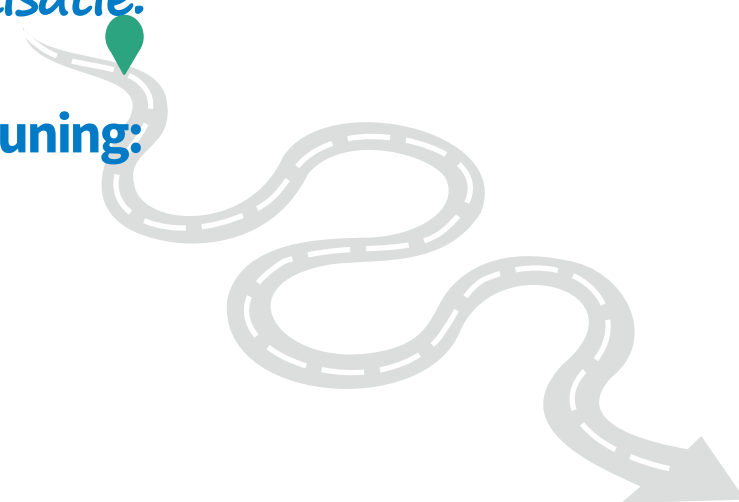


Stimuleer slim en schoon reizen

*Motiveer medewerkers om te fietsen, faciliteer thuiswerken, zorg voor een goede fietsenstalling, maak reizen met het OV (financieel) aantrekkelijk.
Geef mobiliteit een plek in je organisatie.*

Wij helpen met gratis advies en ondersteuning:

- Krijg **inzicht** in kansen voor jullie organisatie
- Doe mee aan onze **fietsacties en events**
- Krijg **advies op maat**

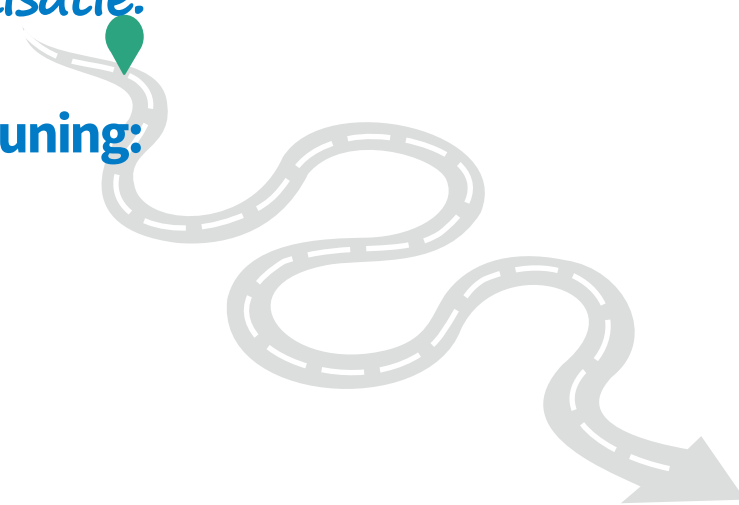

Zijn er vragen ?

